


**COMUNE DI TORTORELLA**  
Provincia di Salerno

**SISTEMAZIONE DELLA STRADA RURALE ORRISI-GIANCAVALLI-PEDALI**

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

Cod.	Attività	Durata gg.
<b>A</b>	<b>ALLESTIMENTO DEL CANTIERE</b>	<b>10</b>
B	Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3
C	Realizzazione della viabilità del cantiere	2
D	Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1
E	Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1
F	Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1
G	Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2
H	Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1
I	Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi	1
L	Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1
<b>M</b>	<b>MOVIMENTI TERRA</b>	<b>27</b>
N	Scavo di sbancamento	6
O	Scavo a sezione obbligata	9
P	Rinterro di scavo	4
Q	Formazione di rilevato stradale e compattazione	7
R	Fresatura di asfalto di carreggiata stradale	2
<b>S</b>	<b>OPERE D'ARTE</b>	<b>35</b>
T	Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	7
U	Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz	5
V	Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	4
Z	Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	7
AA	Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevaz	9
BB	Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	6
CC	Posa di pozzetto di raccordo prefabbricato	3
DD	Realizzazione della carpenteria per chiusini in lavori stradali	1
EE	Lavorazione e posa ferri di armatura per chiusini in lavori stra	2
FF	Getto in calcestruzzo per chiusini in lavori stradali	1
GG	Realizzazione di murature esterne	6
HH	Copia di Posa di tubazione in cemento rotocompresso	2
<b>II</b>	<b>FONDAZIONE E MASSICIATA STRADALE, E TRATTAMENTI S</b>	<b>16</b>
LL	Formazione di fondazione stradale	7
MM	Formazione di massiciata stradale	6
NN	Formazione di manto di usura e collegamento (binder e tappe	3
<b>OO</b>	<b>OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA</b>	<b>23</b>
PP	Posa di materassi metallici	12
QQ	Posa di gabbionature metalliche	11
<b>RR</b>	<b>SEGNALETICA</b>	<b>6</b>
SS	Realizzazione di segnaletica orizzontale	1
TT	Posa di segnali stradali	2
UU	Montaggio di guard-rails	3
<b>VV</b>	<b>SMOBILIZZO DEL CANTIERE</b>	<b>3</b>
ZZ	Smobilizzo del cantiere	3

**DURATA COMPLESSIVA DEI LAVORI 120**

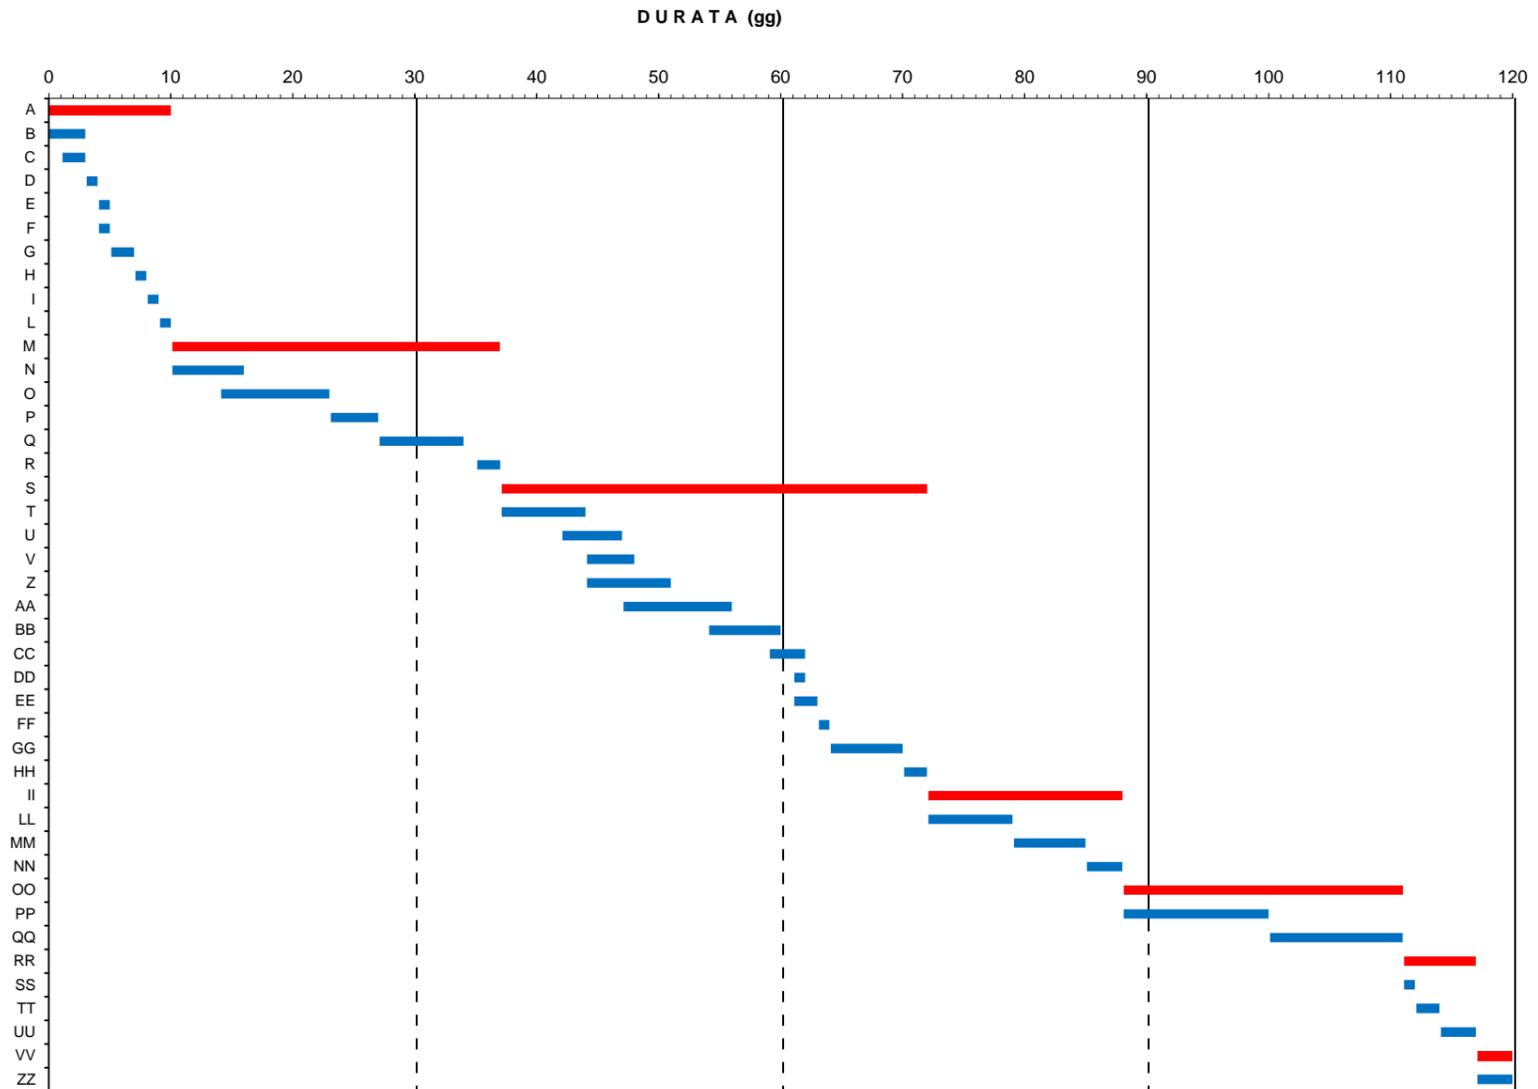

CRONOPROGRAMMA CONTABILE	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
	€ 18.534,34	€ 124.136,15	€ 161.207,53	€ 8.020,32	€ 311.898,34

IL TECNICO
